（２）今年度の事業計画について【資料２】

今年度は下記の事業を計画しております。それぞれの概要、作業箇所等をご確認願います。

① 桜の馬場屋外トイレ改築工事について（図１－１、１－２）

・概要：昨年度実施した設計に基づき、桜の馬場に既設の屋外トイレ及び四阿を撤去し、その跡地に新規屋外トイレ（延床面積：36.25 ㎡、建築面積 37.50 ㎡）を建築する。

・工期：令和２年７月～令和３年３月

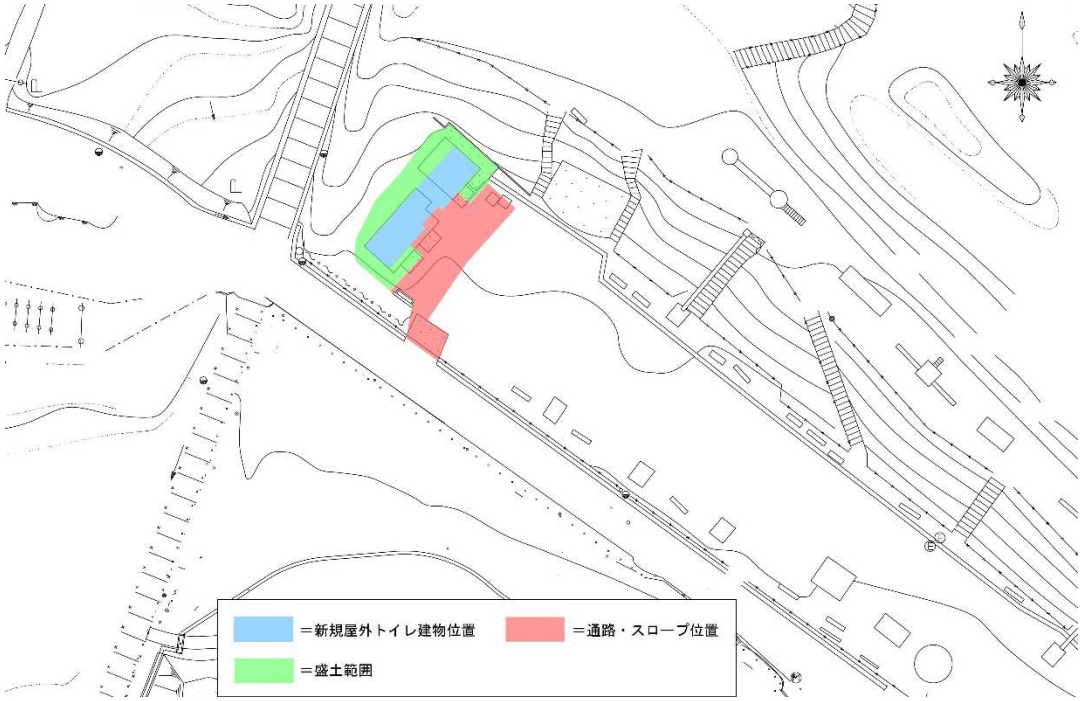

図１－１　現況地形における工事範囲

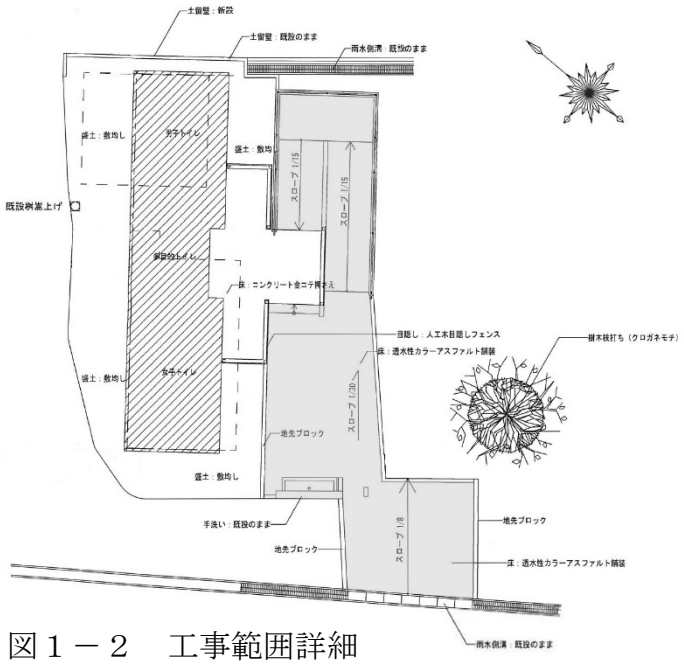

図１－２　工事範囲詳細

② 主郭地区物置・消防サイレン塔撤去工事について（図２）

・概要：主郭地区第整備に先立ち、整備の支障になる既設物置及び消防サイレン塔を撤去する。なお、埋設物の撤去に際しては、文化財担当職員が立ち会いの上で掘削を行い、都度状況を確認しながら進める。

・工期：令和２年５月～令和２年７月

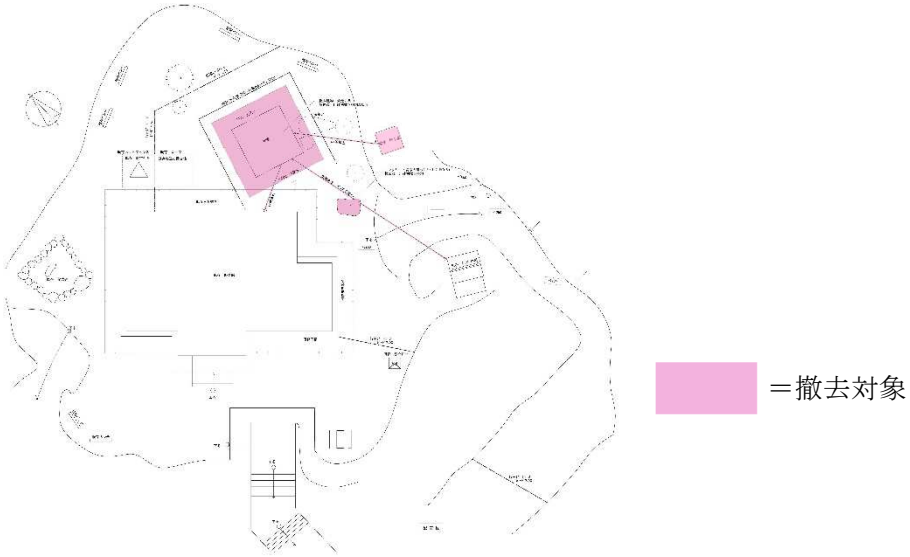

図２　撤去対象

③ 作業道整備工事について（図３）

・概要：昨年度の実施設計に基づき、現管理道のうち８４０ｍを作業道として整備する。

・工期：令和２年８月～令和３年２月

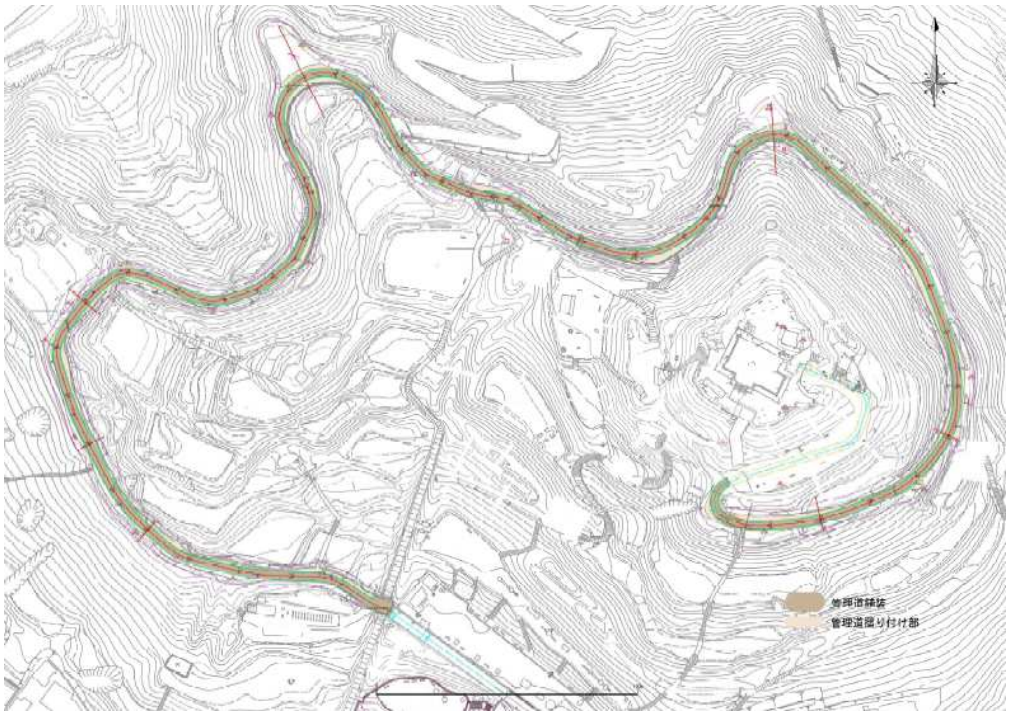

図３　作業道整備工事範囲

④ **主郭地区第１工区整備実施設計について（図４）**

・概要:昨年度の第５工区に引き続き、主郭西側の第１工区 1,150 ㎡について、整備実施設計をする。

期間：令和２年６月中旬～令和３年３月

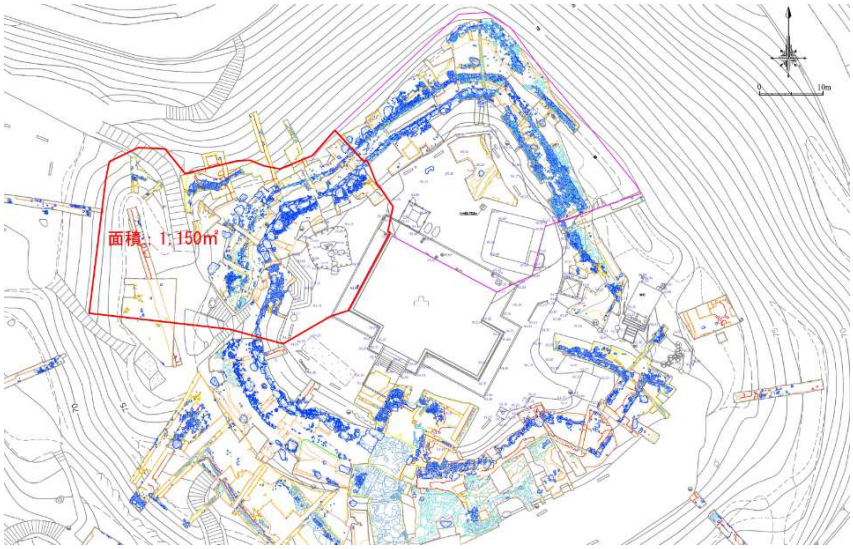

図４　主郭地区第１工区整備範囲

⑤ **小牧山城史跡情報館（旧管理道部分）整備実施設計について（図５）**

・概要：昨年度発掘調査を実施した旧管理道部分及びその周囲約 3,000 ㎡について整備実施設計をする。

・期間：令和２年６月中旬～令和３年３月

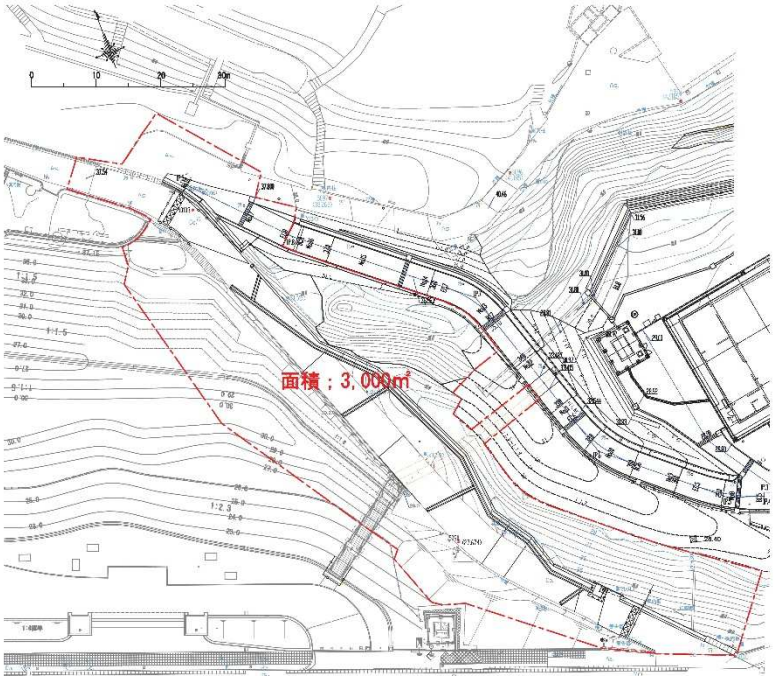

図５　小牧山城史跡情報館（管理道部分）整備実施設計範囲

⑥ 浄化槽撤去工事測量設計について（図６）

・概要：小牧市では公共下水道事業計画に基づき下水道事業計画区域を定めており、供用開始の公示を受けたエリアは公共下水道への接続を行う必要があります。主郭地区に既設の浄化槽は、経年劣化により機能が著しく低下していますが、史跡小牧山（小牧市堀の内１丁目）はその全域が下水道の供用開始区域に指定されており、浄化槽の更新ができません。そのため、既設浄化槽の撤去と公共下水道への接続に必要な工事設計書及び図面の作成業務として、測量設計を実施します。
設計の方針としては、撤去対象である浄化槽から青年の家付近に至る既設排水管と同じルートにて管を入れ替えるもので、新規ルートでの掘削は行わない計画としています。また、掘削を伴う際には、文化財担当職員立会いの下での作業とすることを徹底します。

・期間：令和２年７月～令和３年３月

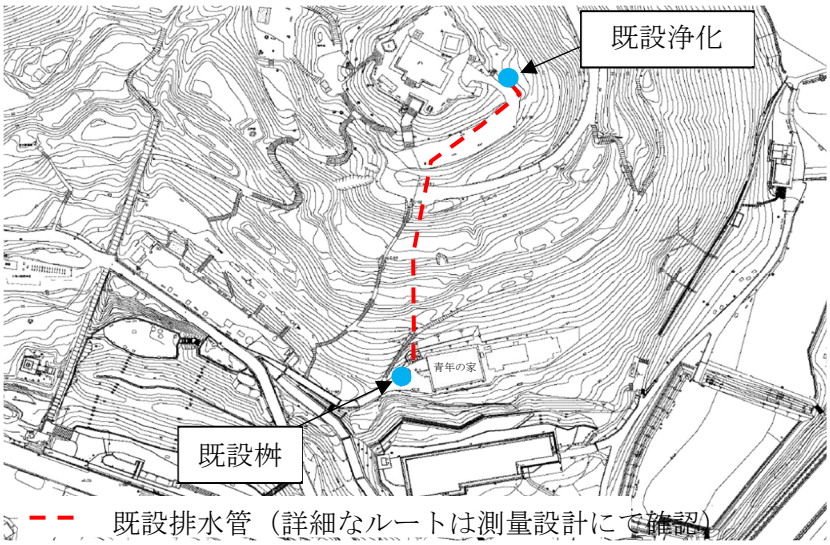

図６　関係既設設備位置図

⑦ 「青年の家」山側斜面法面補修工事について（図７）

・概要：青年の家（昭和 39 年築）の建設の際に削平された山側斜面で旧地形の崩落や落石を防止するための植生ネット（延長 14m×高さ２m）による保護工事を行います。植生ネット設置時のアンカー杭打設の際には文化財担当職員立会いの下での作業とします。

・工期：令和２年７月以降１か月程度

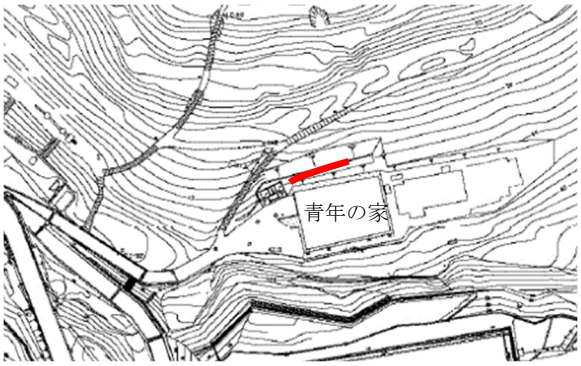

図７　植生ネット設置箇所図
