記入例

工　事　工　程　表

工事名	○○工事
工事場所	
工　期	令和２年１０月１日　～　令和３年３月４日
請負額	○○,○○○,○○○円

凡例　計画工程　実施工程

受注者名　　㊞

現場代理人

No.	工　種	種別	細別	数量		構成比率(%)
1	準備・後片付け			1	式	5.0
2	土工	床堀		120	㎥	3.0
3		埋戻し	流用土・RC-40	98	㎥	7.0
4		残土処理		80	㎥	6.0
5	排水工	U型側溝	PU3-300×300	208	m	22.0
6		蓋工	PC4-B300	382	枚	17.0
7			ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(300)	22	枚	5.0
8		現場打蓋工	300	6	m	1.0
9		U型側溝	PU1-180×180	2	m	1.0
10		排水接続	φ100以下	6	箇所	1.0
11	舗装工	表層工		350	㎡	8.0
12		不陸整正		238	㎡	1.0
13	交通安全施設設置工	区画線設置		28	m	1.0
14		標識撤去復旧		2	箇所	1.0
15	雑工	舗装切断	As	500	m	4.0
16		舗装版撤去		356	㎡	6.0
17		As処分		18	㎥	3.0
18		Co取壊し処分		20	㎥	6.0
19		境界標設置		20	枚	1.0
20		濁水処理		1	式	1.0

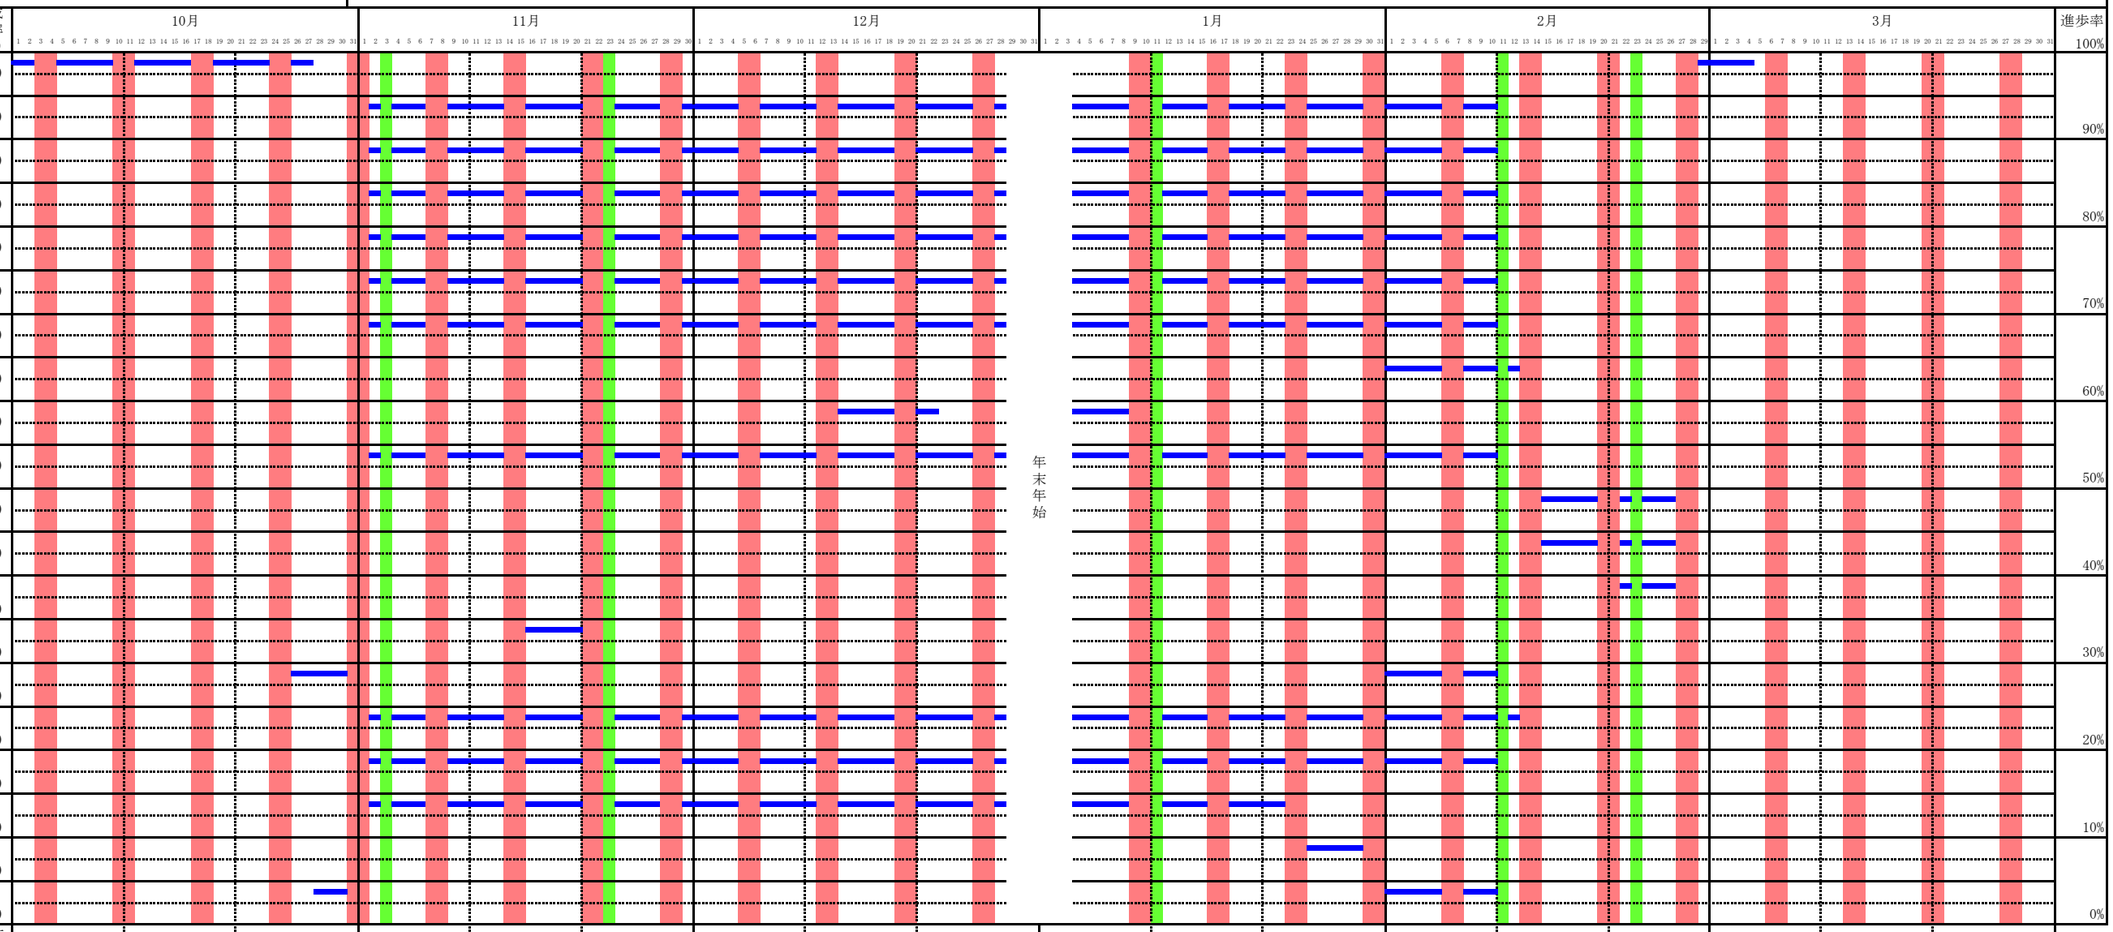

全　体　工　程　　計画　実績

備　考

着手 休工　休工　休工　休工　休工 祝日 休工　休工　休工　休工　休工　休工　休工　休工 休工 休工 祝日 休工　休工　休工　休工　祝日 休工　休工 祝日 休工　竣工
